



丸亀城石垣崩落復旧整備事業が 当初の目標から 1 年遅れになります

令和 6 年 3 月末まで（5 年）の復旧を目標に掲げ、完成に向けて工事を進めていきましたが、石材の破損が予想以上に広範囲に及んでいたことや、崩落面が想定より深く、除去する土砂（栗石・盛土）の増加により、解体作業に時間を要しています。2 度と崩れない石垣を早期に復旧するため、関係者一同、力を合わせて頑張りますので、ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。

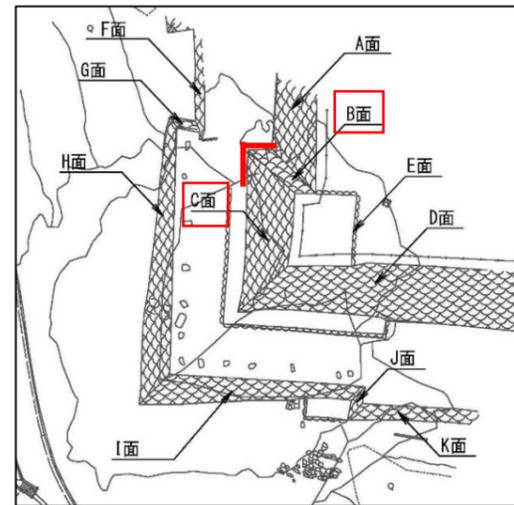


左の写真は三の丸 BC 面の地中石垣です。石を水色の線で囲み、割れた状態をピンクで着色しています。大きな築石に無数のクラック（亀裂）が入り、ほとんどの石が割れています。

【平面図】

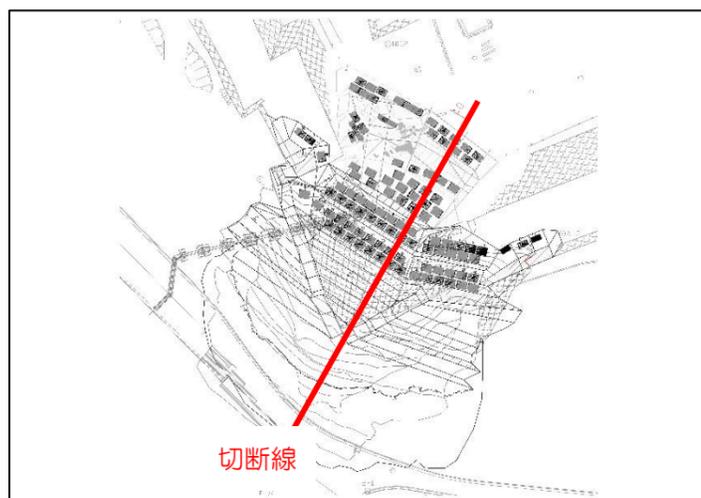

【断面図】

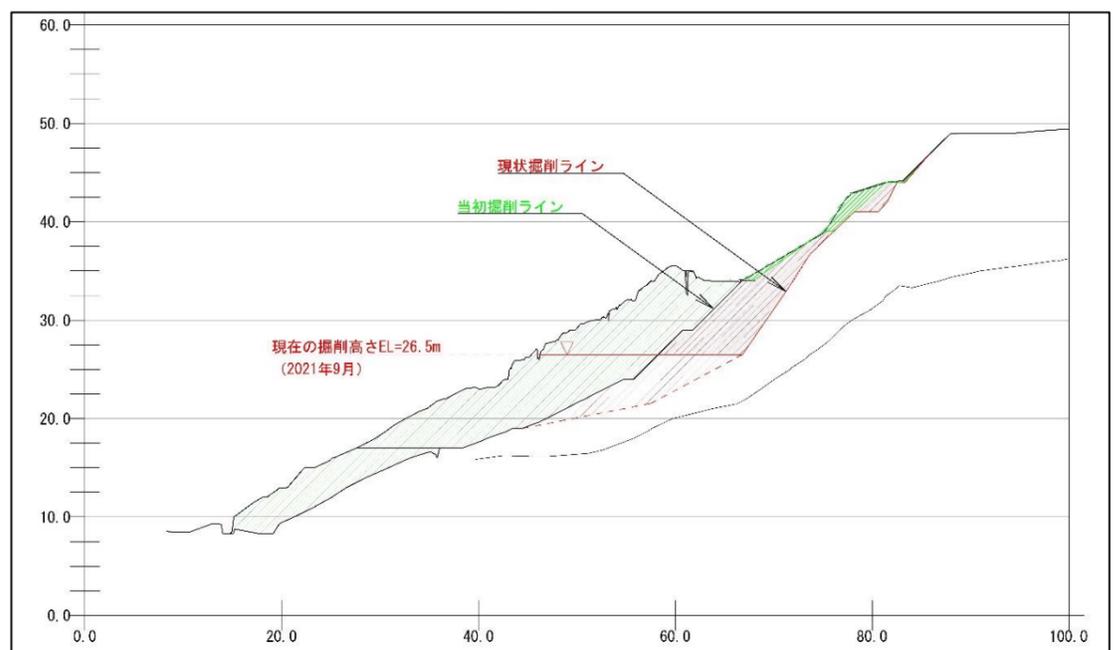

右の断面図は切断線を横から見たところです。緑の当初掘削ラインから、赤で示す現状掘削ラインになりました。
