■城東小学校校舎改築工事計画

	Ⅰ期	Ⅱ期	Ⅲ期	Ⅳ期
配置図	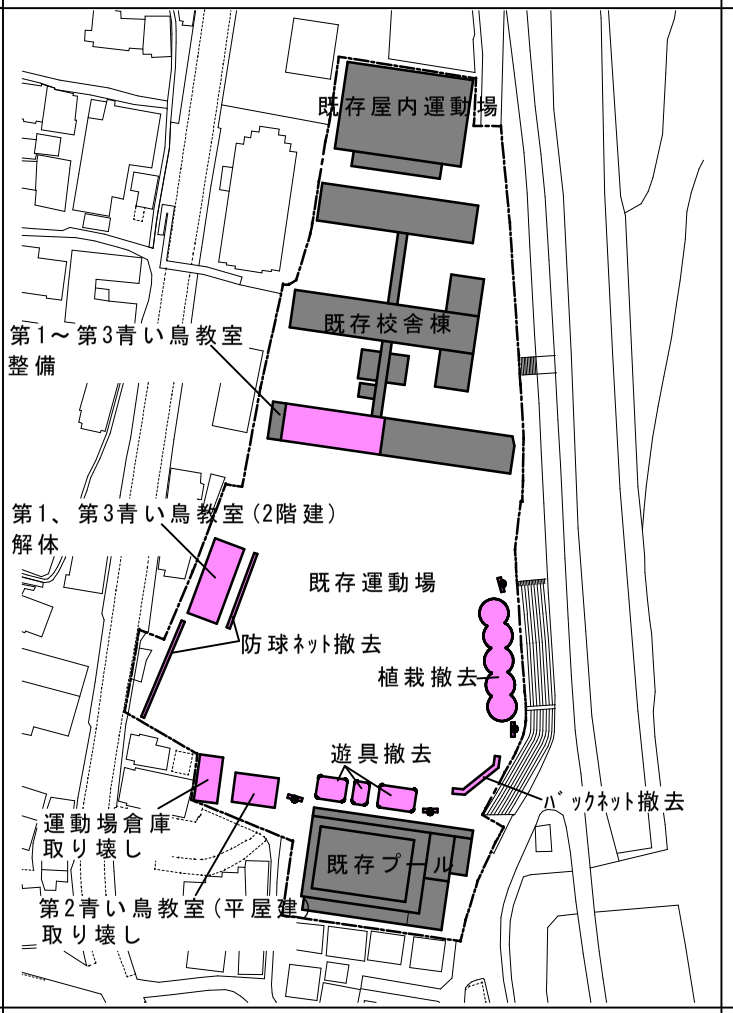	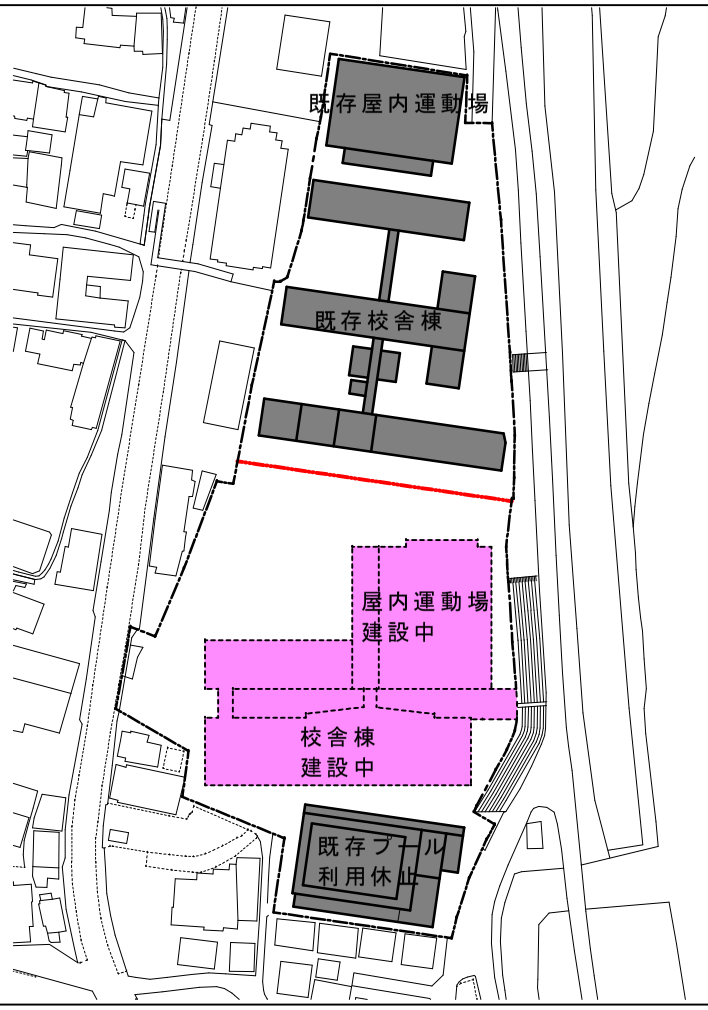	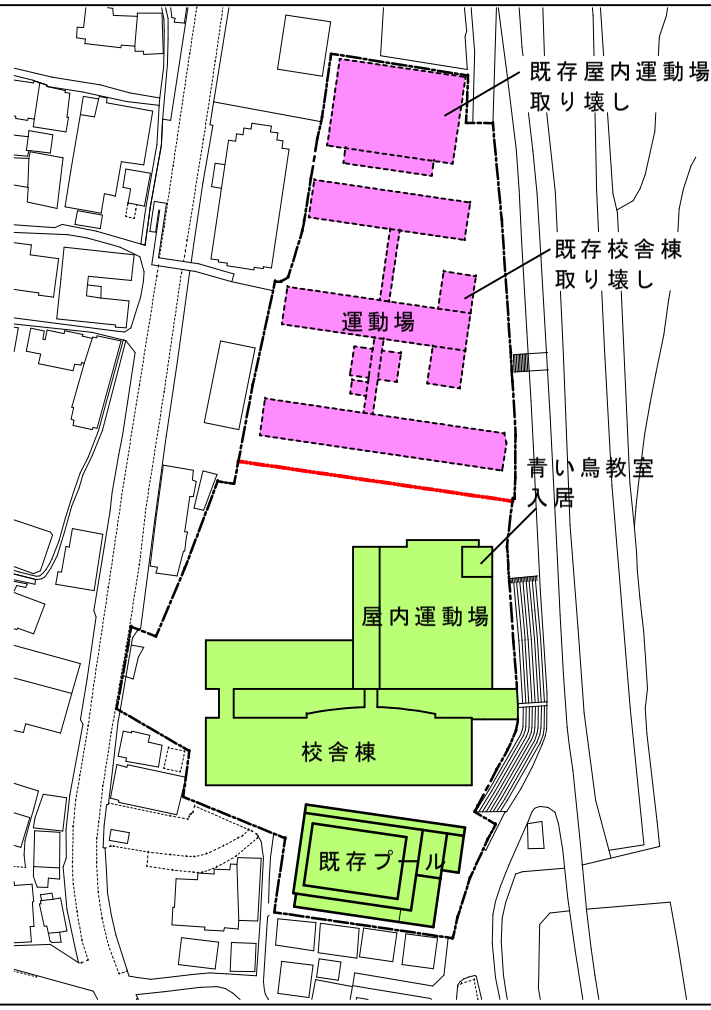	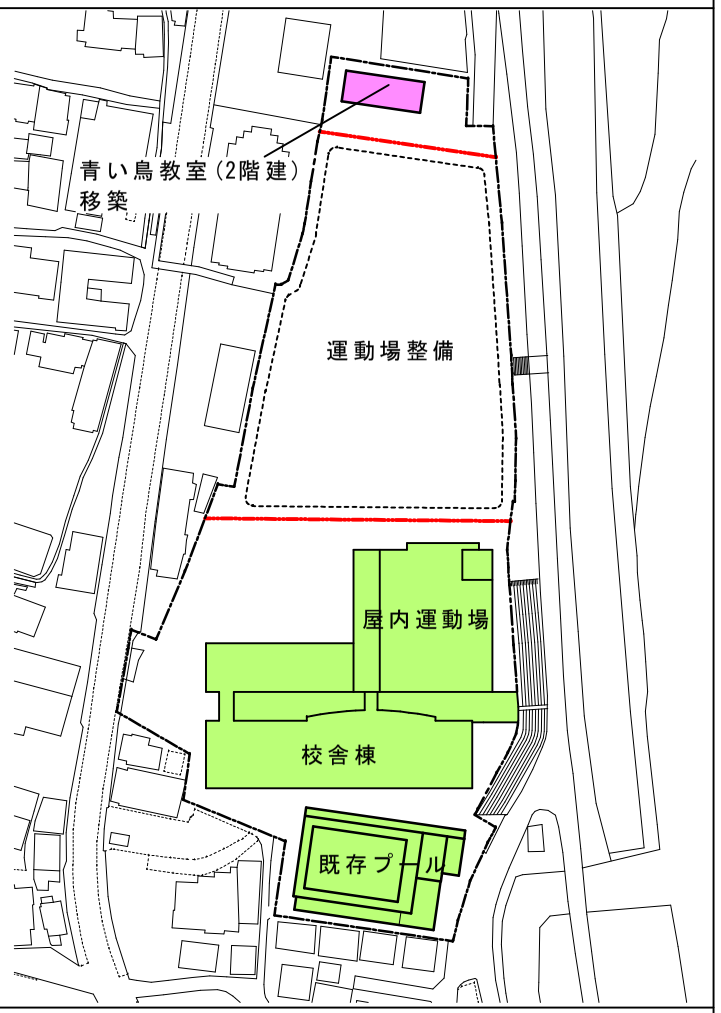
建替え計画	○第1～第3青い鳥教室を既存校舎棟に整備する。 ○第1～第3青い鳥教室を解体する。 ○屋外倉庫・遊具・防球ﾈｯﾄ・ﾅｲﾀｰ照明・植栽の撤去。	○運動場位置に校舎棟・屋内運動場を建設する。 ○既存校舎棟・屋内運動場は工事期間中に利用を継続する。 ○既存プールは利用を休止する。 ○第1～第3青い鳥教室は既存校舎棟で運営を継続。 ○運動場の利用は不可。	○校舎棟・屋内運動場の完成・引越し・運用を開始する。 ○既存プールの利用を再開する。 ○既存屋内運動場を解体撤去する。 ○既存校舎棟・屋内運動場を解体撤去する。	○既存校舎解体場所に運動場の整備を行う。 ○ﾌｪﾝｽ及び外構・ﾅｲﾀｰ照明・防球ﾈｯﾄ整備を行う。 ○既存屋内運動場解体場所に第1、3青い鳥教室の建設を行う。

■工事スケジュール

	令和５年度												令和６年度												令和７年度												令和８年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
工事内容	運動場利用不可期間																																														
	既存校舎青い鳥教室整備・青い鳥教室解体																																														
				屋外倉庫・遊具・防球ﾈｯﾄ・ﾅｲﾀｰ照明・植栽等撤去																																													
										新校舎・屋内運動建設工事																																												
																															既存校舎・屋内運動解体工事																			
																																								運動場・外構・ﾅｲﾀｰ照明・防球ﾈｯﾄ整備											
